



PNRR – Missione 6 Overview

Bolzano, Novembre 2023




Macrocriticità incontrate nella realizzazione degli interventi e ulteriori riflessioni

Ambito	Tematica
Target	<ul style="list-style-type: none">• Difficoltà nel raggiungimento del target intermedio (30/09/23 o 31/12/23) per alcune costruzioni, in particolare quelle soggette a rimodulazione (nel caso della Provincia Autonoma di Bolzano il punto riguarda Ospedale della Comunità e Casa della Comunità di Egna e Casa della Comunità Vipiteno).
	<ul style="list-style-type: none">• La Provincia Autonoma di Bolzano ha segnalato sin dall'inizio agli organismi centrali (Unità di Missione, Agenas, ...) che Case della Comunità, Ospedali della Comunità e Centrali Operative Territoriali sarebbero stati realizzati nelle medesime strutture. Tuttavia, in quanto gli Accordi Quadro di Invitalia hanno previsto lotti ed aggiudicazioni differenti si sono riscontrate difficoltà amministrative nella realizzazione delle opere (vedi incarico a due operatori economici distinti per Ospedale della Comunità e Casa della Comunità di Bolzano).
	<ul style="list-style-type: none">• Le risposte di Invitalia a quesiti posti dai RUP per risolvere questioni contrattuali e amministrative, anche derivanti dal punto precedente, presentano spesso ampio spazio di interpretazione: questo comporta un allungamento dei tempi di risposta e conseguentemente potenziale ritardo nel raggiungimento delle scadenze prestabilite.
Monitoraggio e Regis	<ul style="list-style-type: none">• Necessità di messa a disposizione quanto prima della Dashboard di monitoraggio per visualizzare centralmente i dati caricati su Regis, affinché sia la Provincia Autonoma di Bolzano che l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige possano vedere in maniera aggregata l'avanzamento delle attività. Regis non presenta questa funzionalità, ma l'Unità di Missione con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti sta implementando tale strumento.
	<ul style="list-style-type: none">• Difficoltà nell'evadere richieste ministeriali poste con scadenza molto ravvicinata, specialmente per quanto riguarda il monitoraggio di target, nonché la produzione di documentazione ulteriore. Tuttavia, in vista di una piena implementazione della Dashboard, nonché del pieno utilizzo di Regis da parte di tutti i RUP queste richieste potrebbero diminuire. Si segnala a questo proposito il netto miglioramento nell'inserimento dei dati a fronte del supporto fornito da Cassa Depositi e Prestiti ai RUP ed all'Amministrazione Provinciale. Si auspica che il supporto di Cassa Depositi e Prestiti possa essere anche fornito per avvio e consolidamento della fase di rendicontazione.
	<ul style="list-style-type: none">• Assenza di linee guida di dettaglio o che siano applicabili alle specifiche misure per l'utilizzo di Regis per alcune misure non relative alle costruzioni e che presentano rendicontazione in modalità semplificata (es. ADI, Corso di competenze manageriali, ...).
Sogg. Attuatori	<ul style="list-style-type: none">• Suggerimento di attivare gruppi di lavori o tavoli condivisi di carattere operativo tra Regioni e PPAA, in qualità di soggetti attuatori, per scambiare informazioni ed esperienze sulle best practice da seguire nell'implementazione delle misure. Ad es. per la Provincia Autonoma di Bolzano per l'intervento «COT Device» sarebbe utile il confronto con un altro soggetto attuatore sull'acquisto dei prodotti elettromedicali, lo stesso per le misure relative alla formazione (es. Competenze manageriali, ...), così da non doversi confrontare continuamente con Agenas e in modo da accorciare i tempi di risposta.

Strutture da realizzare nell'ambito della M6 C1 nella Provincia Autonoma di Bolzano


Misura	Intervento	Tipo lavoro	Costo opera	Finanziamento PNRR	Finanziamento Provincia	Note
COT Target: 5 COT	COT Bolzano	ristrutturazione	120.000 €	120.000 €	0 €	COT attiva
	COT Bressanone	ristrutturazione	1.032.113 €	173.075 €	859.038 €	COT attiva in struttura temporanea + costo struttura temp.: 20.000 € (finanz. Prov.)
	COT Brunico	nuova costruzione	581.571 €	173.075 €	408.496 €	COT attiva in struttura temporanea + costo struttura temp.: 10.000 € (finanz. Prov.)
	COT Egna	nuova costruzione	864.254 €	226.150 €	638.104 €	costo provvisorio, in attesa della progettazione definitiva per rispettare il target sarà attivata una COT in struttura temporanea + costo struttura temp.: 10.000 € (finanz. Prov.)
	COT Merano	nuova costruzione	481.460 €	173.075 €	308.385 €	COT attiva in struttura temporanea + costo struttura temp.: 12.200 € (finanz. Prov.)
OdC Target: 3 OdC	OdC Bolzano	nuova costruzione	10.289.585 €	2.613.929 €	7.675.656 €	
	OdC Egna	nuova costruzione	7.497.772 €	2.613.929 €	4.883.843 €	costo provvisorio, in attesa della progettazione definitiva
	OdC Merano	nuova costruzione	9.712.775 €	2.613.929 €	7.098.846 €	
CdC Target: 10 CdC	CdC Bolzano	nuova costruzione	12.381.334 €	1.437.661 €	10.943.673 €	
	CdC Bressanone	ristrutturazione	1.700.000 €	1.700.00 €	0 €	
	CdC Brunico	nuova costruzione	8.432.787 €	2.490.320 €	5.942.467 €	
	CdC Chiusa	ristrutturazione	536.890 €	536.890 €	0 €	
	CdC Egna	nuova costruzione	8.493.659 €	1.437.661 €	7.055.998 €	costo provvisorio, in attesa della progettazione definitiva
	CdC Laives	nuova costruzione	17.756.000 €	2.076.084 €	15.679.916 €	
	CdC Merano	nuova costruzione	10.977.306 €	1.437.666 €	9.539.640 €	
	CdC Naturno	ristrutturazione	1.746.500 €	1.437.666 €	308.834 €	
	CdC San Candido	ristrutturazione	385.000 €	385.000 €	0 €	
	CdC Vipiteno	ristrutturazione	1.725.193 €	1.437.661 €	287.532 €	costo provvisorio, in attesa della progettazione definitiva
TOTALE			94.714.199 €	23.083.771 €	71.630.428 €	

Strutture da realizzare nell'ambito della M6 C1 nella Provincia Autonoma di Bolzano

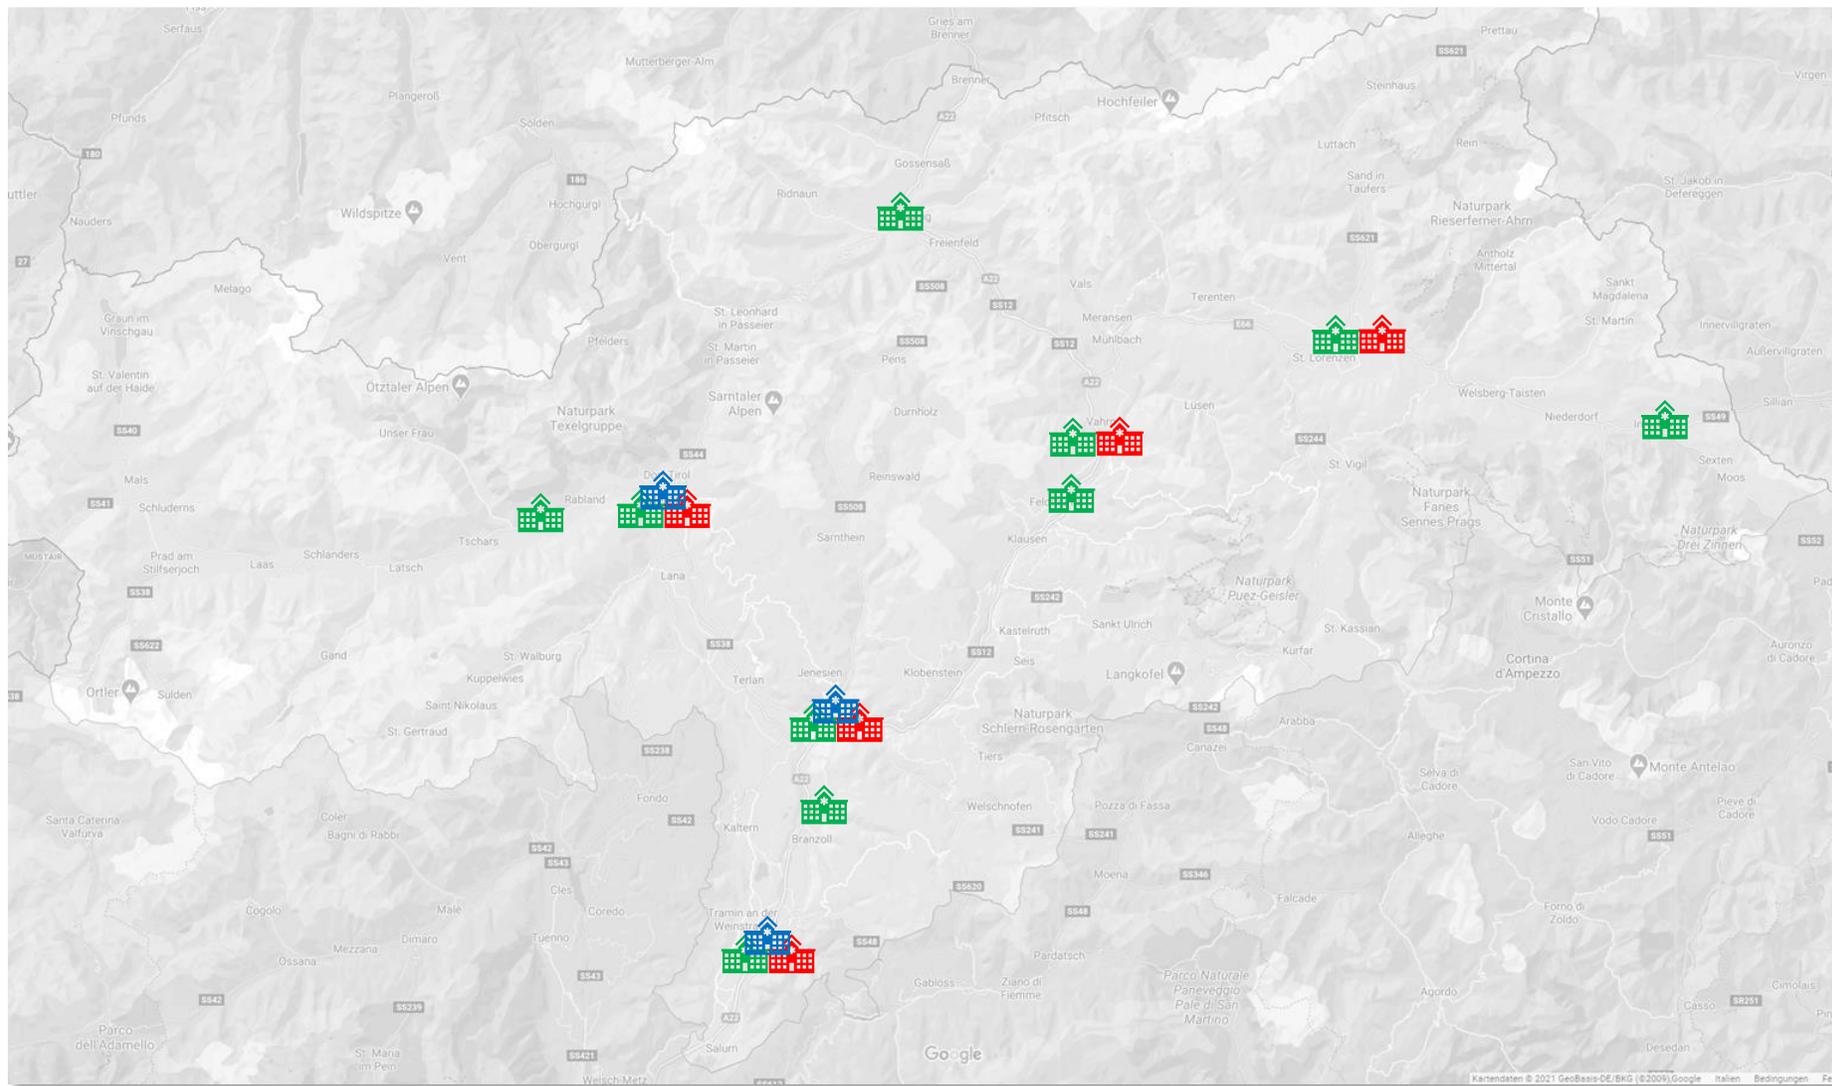

-  Ospedale di Comunità
-  Casa di Comunità
-  Centrale operativa territoriale

Rendering della casa di comunità di Laives

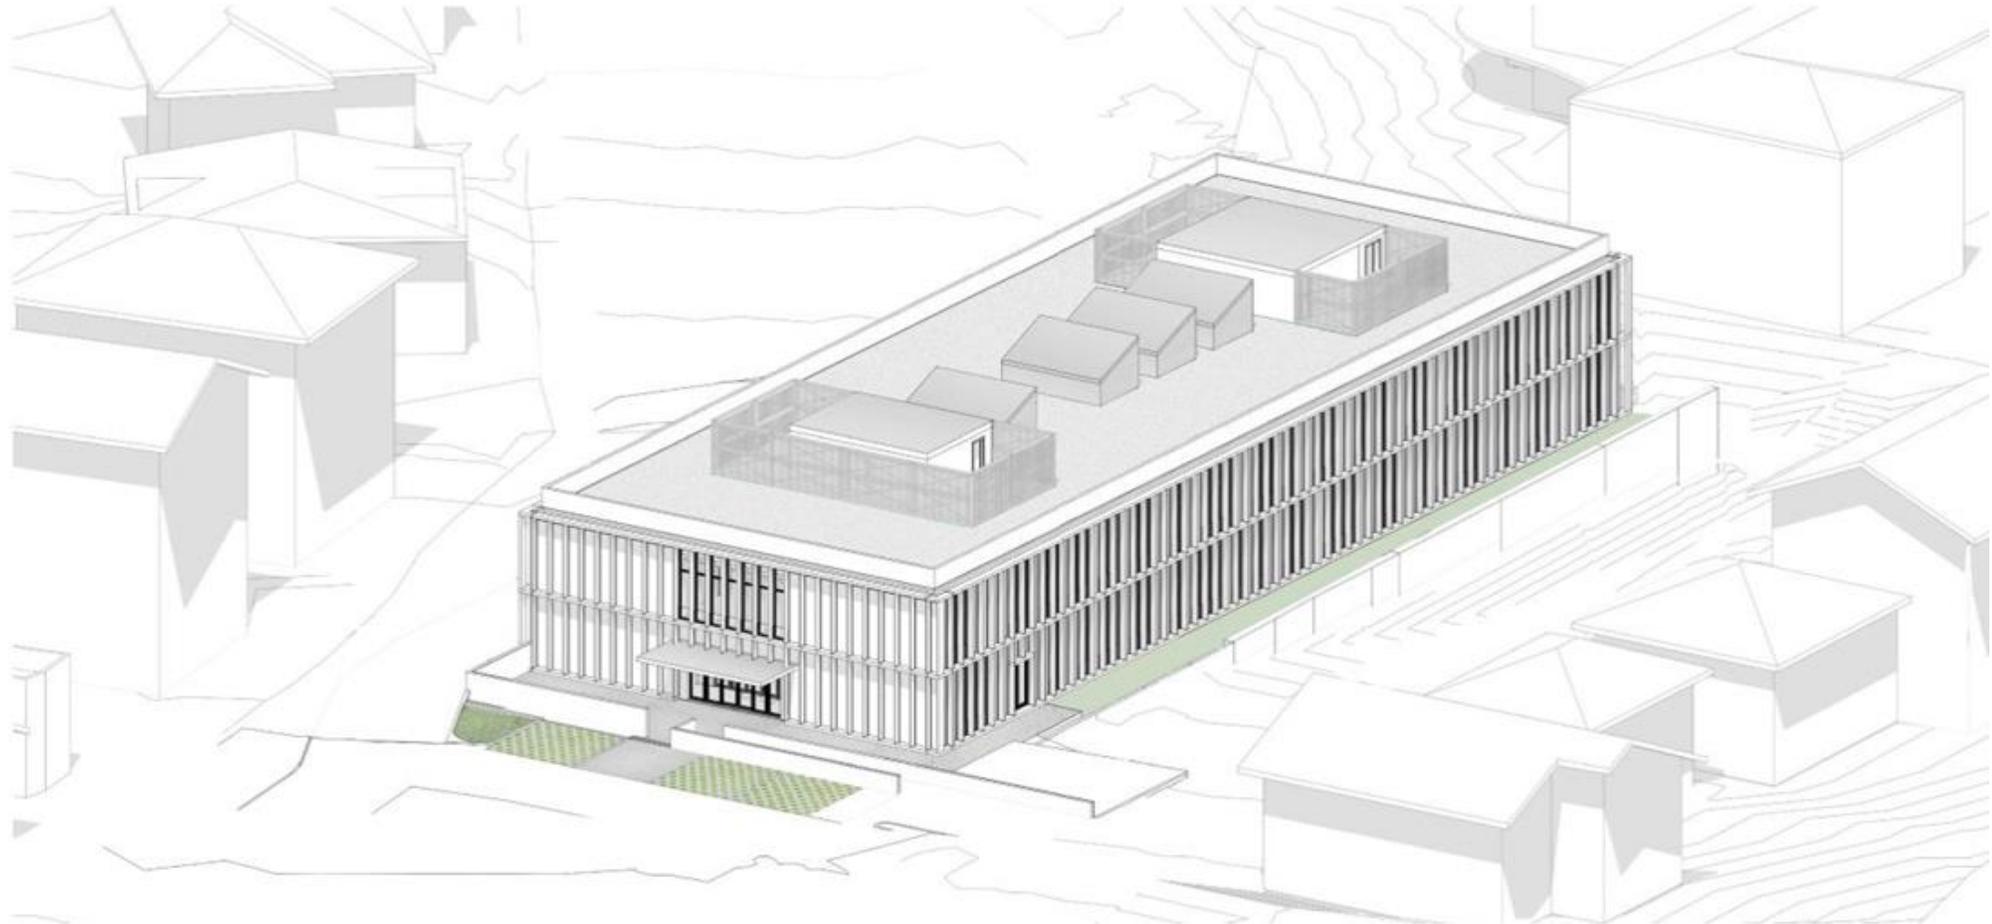

Rendering dell'ospedale e casa di comunità, COT di Merano



Rendering dell'ospedale e casa di comunità di Bolzano

