

PNRR MISSIONE 6 SALUTE – STATO DI ATTUAZIONE DEL CIS IN VISTA DELLA RENDICONTAZIONE DELLA 9 E DELLA 10 RATA

Dott. Iachino Achille

Direttore Generale
Unità di Missione per l'attuazione del PNRR
Ministero della Salute

Dott. Altamura Gianluca

Direttore Ufficio di Monitoraggio
Unità di Missione per l'attuazione del PNRR
Ministero della Salute

25 novembre 2025

Agenda


1. Milestone e Target di rilievo comunitario residui (IX e X Rata PNRR) e la nuova rimodulazione del PNRR
2. Monitoraggio dello stato di attuazione degli investimenti (T4 2025) aggiornamento Novembre 2025 - Focus ADI, Interventi strutturali e digitalizzazione

OBIETTIVI

- ✓ Allineare i servizi ai bisogni delle comunità;
- ✓ Integrare servizi sanitari e sociali;
- ✓ Superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio;
- ✓ Rafforzare i servizi sanitari di prossimità, secondo un approccio «one health»
- ✓ Innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN,
- ✓ Migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche;
- ✓ Sviluppare nuove competenze e superare il cd «imbuto formativo»
- ✓ Promuovere la ricerca e l'innovazione in ambito sanitario.



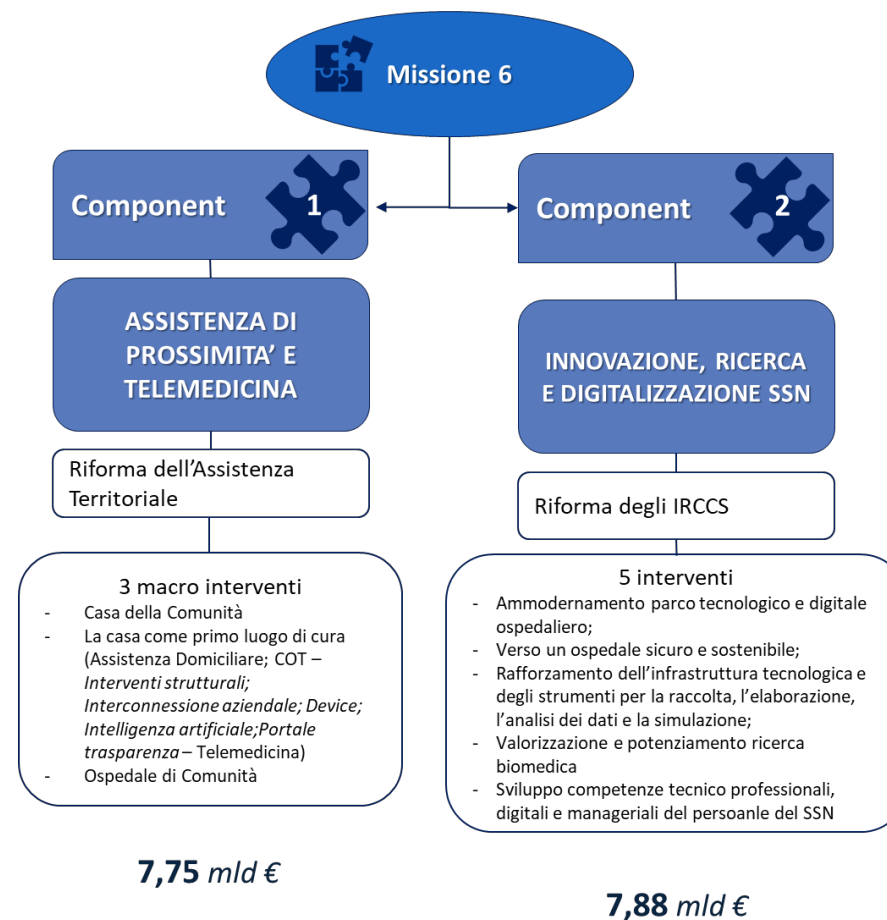

RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE IN SALUTE

15,62 mld di euro



1. Milestone e Target di rilievo comunitario residui (IX e X Rata PNRR) e la nuova rimodulazione del PNRR – proposta della CE del 4/11/2025 al Consiglio dell'UE ([link](#))


Target IX RATA (3 Target)

Milestone & Target	Denominazione/Descrizione ante revisione	Revisione Novembre 2025	Modalità Rendicontazione Target
M6C1-6: Assistenza domiciliare* da T2 2026 a T2 2025 	Almeno 842mila pz over65 aggiuntivi che ricevono Assistenza domiciliare (incrementali rispetto alla baseline 2019)	Almeno 1.487.590 pz over65 su base annua che ricevono Assistenza domiciliare, rilevati attraverso il flusso SIAD (indicatore SIAD05bis)	https://www.agenas.gov.it/pnrr/missione-6-salute/monitoraggio-adi
M6C1-9: Telemedicina T4 2025 	Almeno 300mila persone assistite con strumenti di telemedicina	Almeno 300mila persone assistite con strumenti di telemedicina	PNT - pub - Rendicontazione Nazionale Il raggiungimento del target si baserà sui dati presenti in PNT, monitorati attraverso Dashboard Agenas.
M6C2-8: Digitalizzazione DEA I e II livello T4 2025 	280 DEA di I e II livello digitalizzati	280 DEA di I e II livello digitalizzati	Linee guida Nota Prot. UMPNRR n. 145 del 18/04/2024 Addendum Nota Prot. UMPNRR 8013 del 6/11/2025 Dimostrazione dell'innalzamento di almeno un livello di digitalizzazione attraverso la scala EMRAM, con certificazione di HIMSS
M6C2-11: FSE T4 2025 	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico.		Cruscotto FSE Dimostrazione del target attraverso il raggiungimento dell'indicatore 2 di cui all'Allegato 2 del DM 8 agosto 2022 e s.m.i.


*Scadenza anticipata alla VIII rata per target raggiunto su dati 2024 a livello nazionale (Proposta di revisione del PNRR da Commissione a Consiglio UE 4 novembre 2025)

Target X RATA (1MLS; 9 Target)

Proposta di revisione
trasmessa dalla
Commissione al Consiglio
dell'UE
il 4 novembre 2024

Milestone & Target	Denominazione/Descrizione	Revisione Novembre 2025	Modalità Rendicontazione Target
M6C1-3: Case della Comunità T2 2026 	Almeno 1038 CdC funzionanti e tecnologicamente e equipaggiate	Almeno 1038 CdC con servizi attivati in conformità con la Tab. 4 dell'Allegato 1, sezione 5 del DM 23 May 2022 n.77	Linee guida Nota Prot. UMPNRR n. 977 del 20/03/2025 in corso di aggiornamento (all'esito dei confronti con CE rispetto alle CL esperto indipendente)
M6C1-11: Ospedali di Comunità T2 2026 	Almeno 307 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	Almeno 307 OdC con servizi attivati in conformità con l'Allegato 1, sezione 11 del DM 23 May 2022 n.77	Linee Guida Nota Prot. UMPNRR n. 603 del 27/02/2024
M6C2-6: Grandi Apparecchiature T2 2026 	3.100 Grandi apparecchiature sanitarie sostituite	Almeno 3100 grandi apparecchiature (cluster per tipologia di GA) <ul style="list-style-type: none"> 290 apparecchiature (RMN a 1,5 T o più; Acceleratori Lineari; PET/TAC); 655 apparecchiature (Angiografi; Gamma camere, Gamma camere/TAC; TAC); 2155 apparecchiature (Sistemi radiologici fissi; Mammografi; Ecotomografi). 	Linee Guida Nota Prot. UMPNRR n. 603 del 27/02/2024 Addendum Nota Prot. UMPNRR n. 4584 del 29/11/2024
M6C2-9: progetti in essere ex art. 2 D.Lgs. 34/2020 T2 2026 	Almeno 5.922 p.l. addizionali in terapia intensiva e sub-intensiva	Almeno 5.922 p.l. addizionali in terapia intensiva e sub-intensiva (almeno il 40% PL TI)	Linee Guida Nota Prot. UMPNRR 1968 del 21/05/2024 Specifiche: Nota Prot. UMPNRR 7481 del 22/10/2025
M6C2-10: Verso un ospedale sicuro e sostenibile T2 2026	Completamento di almeno 84 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere	Report basato su collaudo statico delle strutture	Linee guida Nota Prot. UMPNRR 3903 del 11/07/2025
M6C2-10bis progetti in essere ex art. 20 L67/1988 T2 2026 	Almeno il 90% delle risorse RRF erogate	Erogazione di risorse RRF per almeno 225mln di euro	Linee Guida Nota Prot. UMPNRR 1968 del 21/05/2024 Specifiche: Nota Prot. UMPNRR 7615 del 27/10/2025
M6C2-12: FSE – Tessera Sanitaria T2 2026 	Il sistema Tessera di assicurazione malattia e l'infrastruttura per l'interoperabilità con FSE sono pienamente operativi	Il sistema Tessera di Assicurazione Malattia e l'infrastruttura per l'interoperabilità con FSE sono operativi	Collaudi evolutive TS, INI e collaudo EDS
M6C2-13: FSE T2 2026 	Tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano FSE	FSE è utilizzato per la maggior parte dei dati sanitari	Cruscotto FSE Dimostrazione del target attraverso il raggiungimento dell'indicatore 2 di cui all'Allegato 2 del DM 8 agosto 2022 e s.m.i.
M6C2-16: Formazione Manageriale T2 2026 	Formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per 4.500 unità di personale SSN	Formazione manageriale e competenze digitali per almeno 4500 dipendenti SSN	Linee Guida OCS Nota Prot. UMPNRR n. 1654 del 03/05/2024 Nota Prot. Agenas 11089 del 30/10/2025
M6C2-17: Formazione medico-specialistica T2 2026 	4.200 contratti di formazione medica specializzata finanziati	Assegnazione di 4.200 contratti di formazione medico specialistica	Linee Guida OCS Nota Prot. UMPNRR n. 1654 del 03/05/2024 Nota Prot. MUR 64520 del 16/11/2023


Attuazione della «rimodulata» Missione 6 nel tempo sintesi di M6T EU

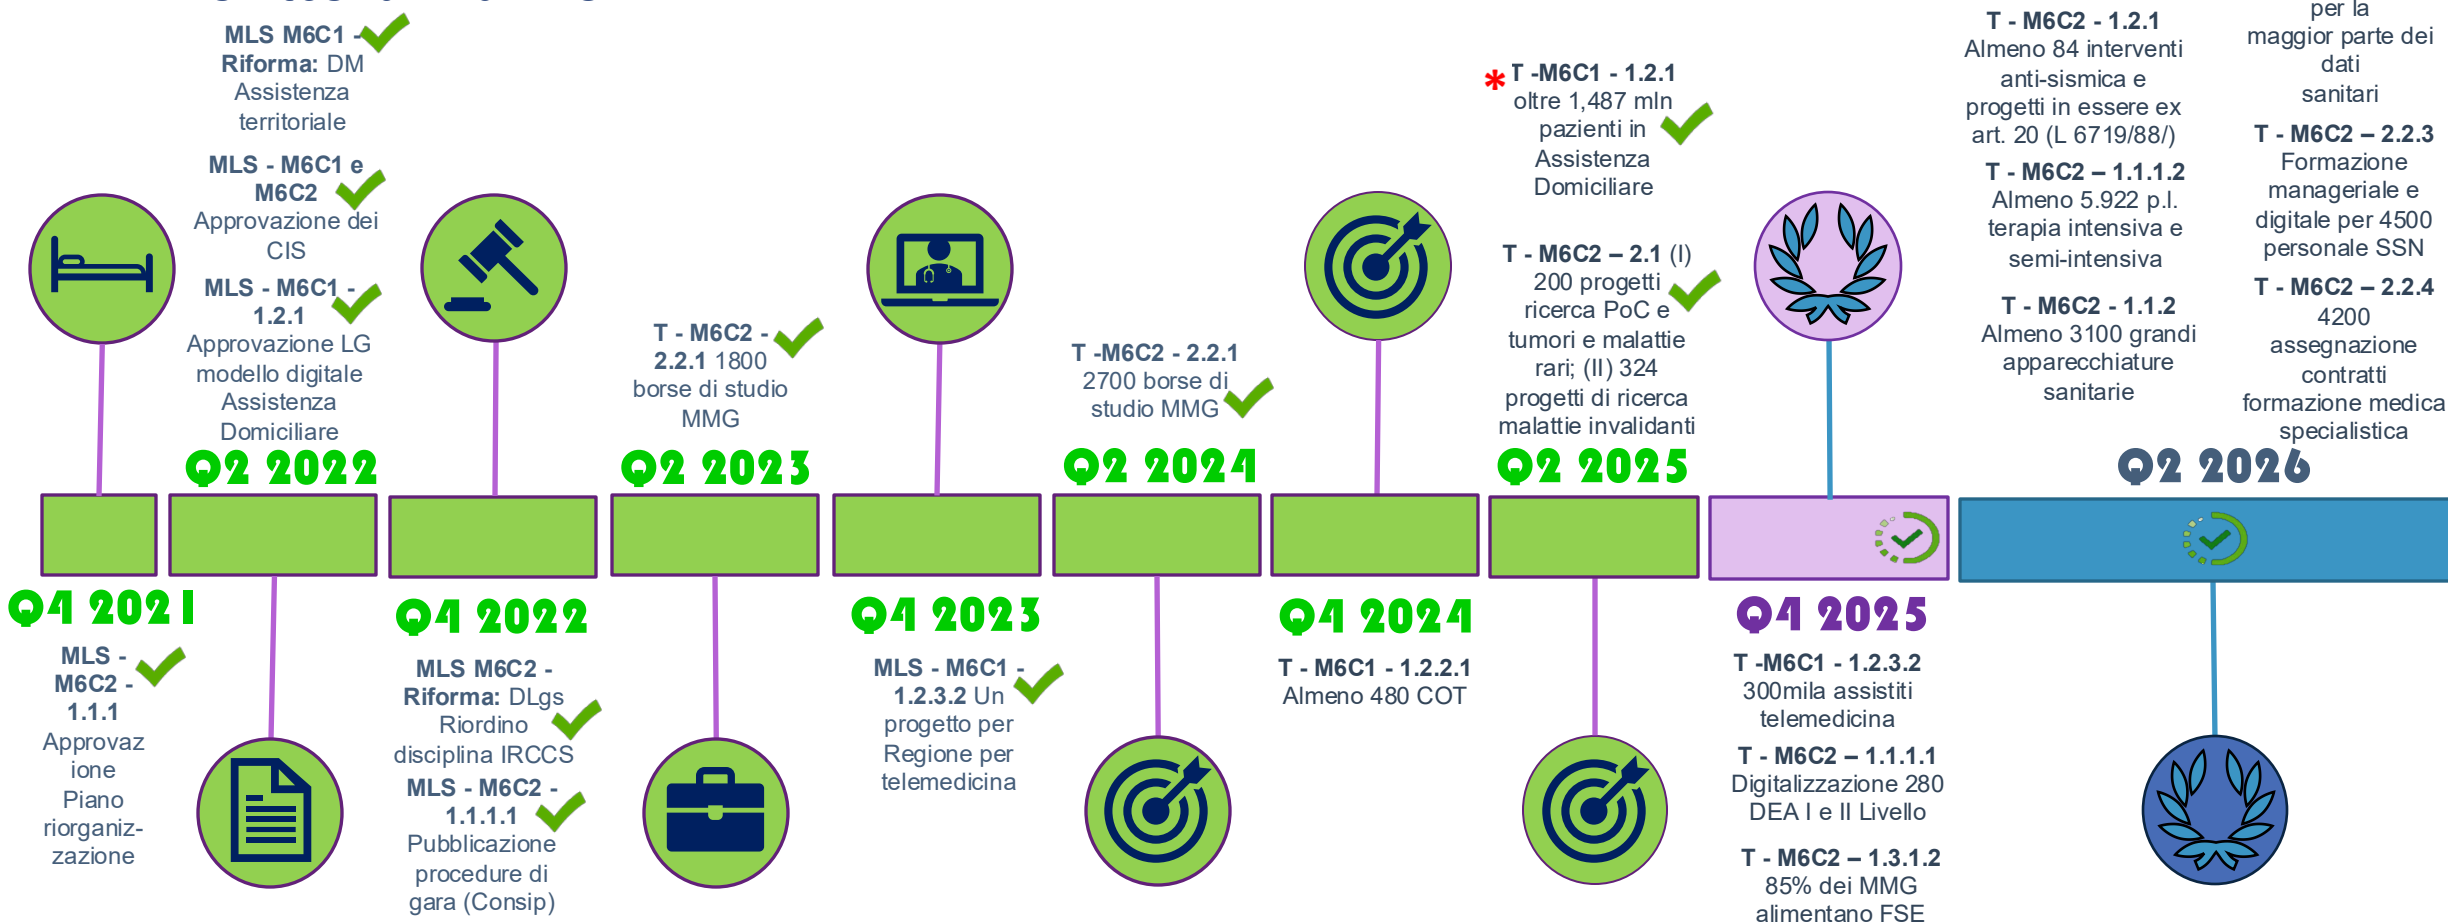


2. Monitoraggio dello stato di attuazione degli investimenti (T4 2025) aggiornamento Novembre 2025 – Focus ADI, Interventi strutturali e digitalizzazione

Target EU: Almeno 842 mila nuovi assistiti presi in carico in Assistenza Domiciliare entro T2 2025, così come da proposta rimodulazione 4/11/2025

Target Decreto 23 gennaio 2023 e s.m.i.	755.554
Assistiti incrementali 2024 (scadenza T1 2025) da Target Decreto 23 gennaio 2023	900.853
Raggiungimento Obiettivo Decreto 23 gennaio 2023	119,23%
Raggiungimento Target M6C1-00-ITA-27	179%
Raggiungimento Target EU M6C1-6	107%

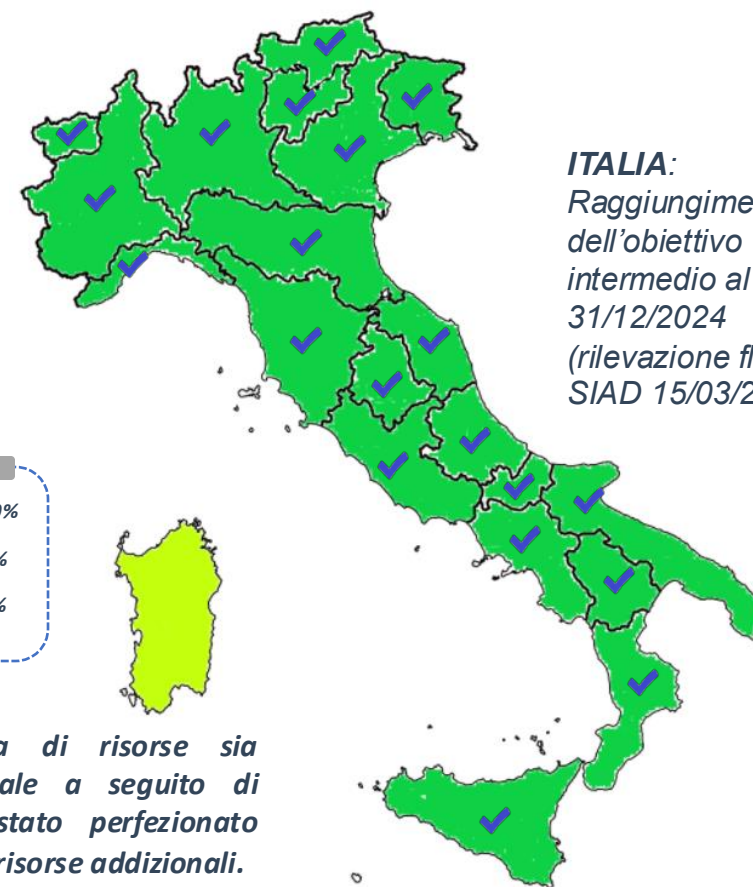

ITALIA:
Raggiungimento
dell'obiettivo
intermedio al
31/12/2024
(rilevazione flusso
SIAD 15/03/2025)

- Alla luce dell'incremento sia di risorse sia dell'obiettivo incrementale finale a seguito di rimodulazione del Piano, è stato perfezionato ulteriore decreto di riparto delle risorse aggiuntive.
- DI 8 aprile 2025 – Adempimenti T2 2026 (anno 2025) 

Stato di attuazione interventi strutturali al T4 2025

Dati consolidati il 21 novembre 2025

Ns Analisi su base dati da dichiarazioni soggetti attuatori, confronto con dati da Sistema informativo ReGiS

Component 1 – Assistenza territoriale



Descrizione obiettivo	Milestone/Target/ Ulteriore step procedurale	CdC (almeno 1038)	OdC (almeno 307)
Stipula dei contratti	Target ITA	Q4 2023* 	Q4 2023* 
Avvio dei cantieri	Punto di controllo in analisi presso UMPNRR - % raggiungimento <i>al 21 novembre 2025</i>	Oltre 100% del Target comunitario	Oltre 100% del Target comunitario
Interventi collaudati	Target Punto di controllo in analisi presso UMPNRR - % raggiungimento <i>al 21 novembre 2025</i>	22%	14%


* Scadenza anticipata di un trimestre dai CIS

M6C11.1: Case della Comunità

Stato di avanzamento lavori – Focus Territoriale

Dati consolidati il 21 novembre 2025
 Ns analisi su base dati da dichiarazioni
 soggetti attuatori in confronto con dati
 da Sistema informativo ReGiS

ITALIA	CASE DELLA COMUNITA'		
	AGGIORNAMENTO AVVIO CANTIERI al 20/11/2025	AGGIORNAMENTO COLLAUDI ANALISI al 20/11/2025	TARGET AL T2 2026
	1317	107	1038
	Oltre 100% del Target Comunitario	10%	

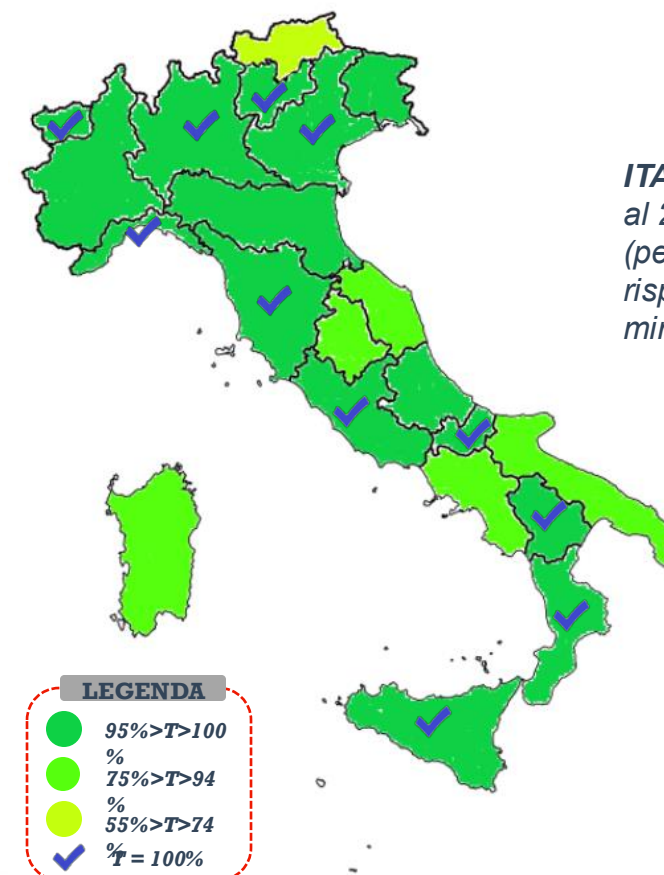


ITALIA: Avvio cantieri
 al 21 novembre 2025
 (percentuale calcolata
 rispetto al Target
 minimo CIS)

M6C11.3: Ospedali di Comunità Stato di avanzamento lavori – Focus Territoriale

*Dati consolidati il 21 novembre 2025
 Ns analisi su base dati da dichiarazioni
 soggetti attuatori in confronto con dati
 da Sistema informativo ReGiS*

ITALIA	OSPEDALI DI COMUNITA'		
	AGGIORNAMENTO AVVIO CANTIERI al 22/09/2025	AGGIORNAMENTO COLLAUDI ANALISI al 22/09/2025	TARGET AL T2 2026
	398	25	307
	Oltre 100% del Target Comunitario	8%	

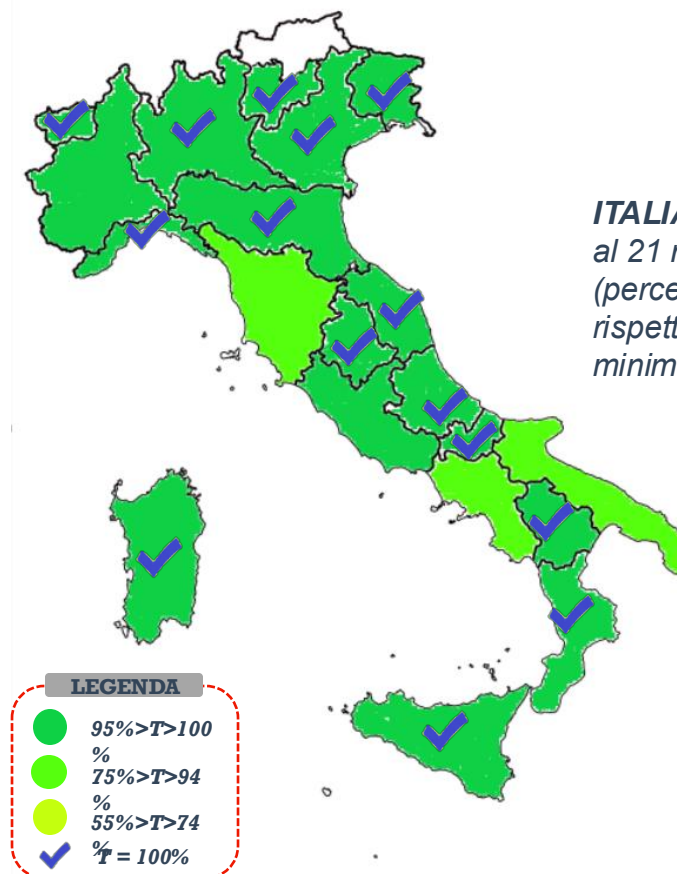


*ITALIA: Avvio cantieri
 al 21 novembre 2025
 (percentuale calcolata
 rispetto al Target
 minimo CIS)*

Stato di attuazione interventi strutturali al T4 2025

Dati consolidati il 21 novembre 2025

Ns Analisi su base dati da dichiarazioni soggetti attuatori, confronto con dati da Sistema informativo ReGiS

Component 2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile

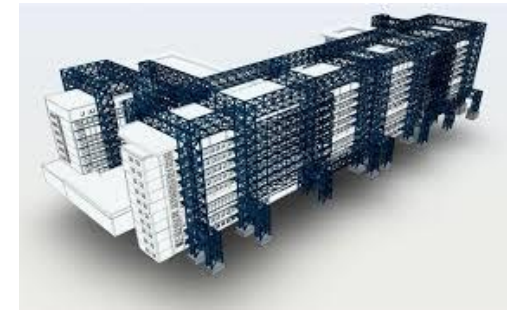


Descrizione obiettivo	Milestone/Target/ Ulteriore step procedurale	CdC (almeno 1038)
Stipula dei contratti	Target ITA	Q4 2023* 
Avvio dei cantieri	Punto di controllo in analisi presso UMPNRR - % raggiungimento al 20 novembre 2025	Oltre 100% del Target comunitario
Interventi collaudati	Target Punto di controllo in analisi presso UMPNRR - % raggiungimento al 20 novembre 2025	7%

* Scadenza anticipata di un trimestre dai CIS

M6C11.3: Verso un ospedale sicuro e sostenibile Stato di avanzamento lavori – Focus Territoriale

*Dati consolidati il 21 novembre 2025
 Ns analisi su base dati da dichiarazioni
 soggetti attuatori in confronto con dati
 da Sistema informativo ReGiS*

Verso un ospedale sicuro e sostenibile			
	AGGIORNAMENTO AVVIO CANTIERI al 22/09/2025	AGGIORNAMENTO COLLAUDI ANALISI al 22/09/2025	TARGET AL T2 2026
ITALIA	118	6	84
	Oltre 100% del Target Comunitario	7%	

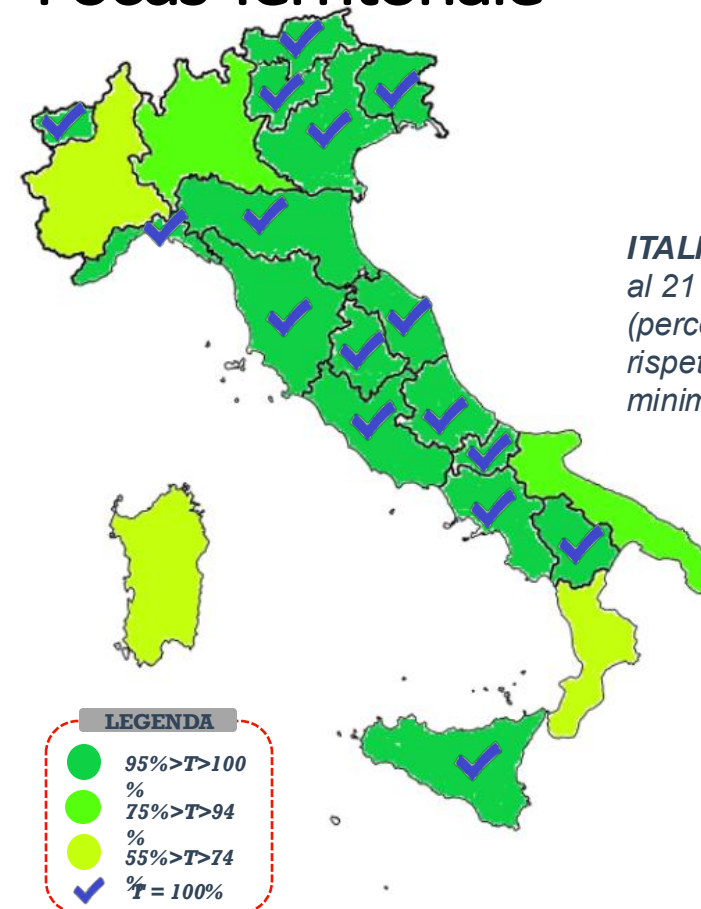


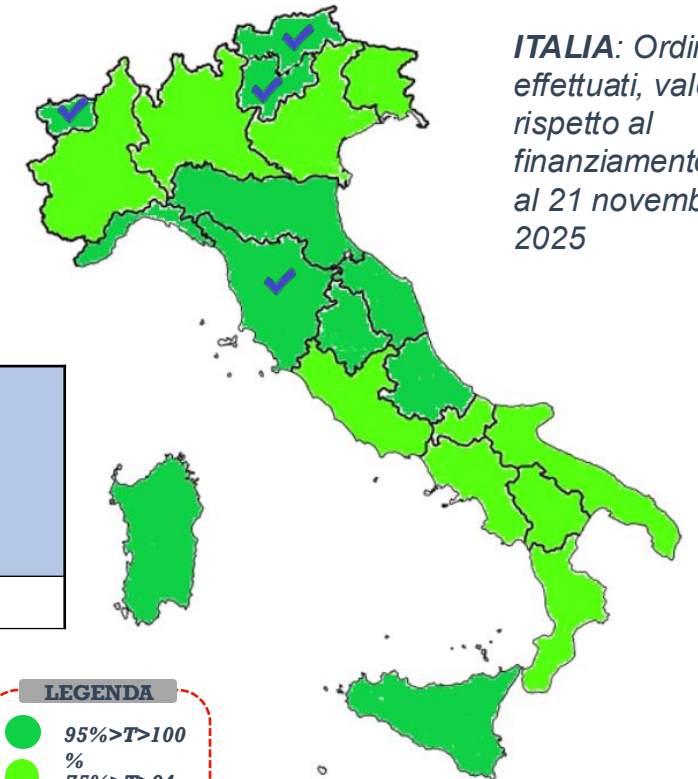
ITALIA: Avvio cantieri
 al 21 novembre 2025
 (percentuale calcolata
 rispetto al Target
 minimo CIS)

Component 2 – Ammodernamento Tecnologico

Dati consolidati il 21 novembre 2025
Ns Elaborazione su base dati da
dichiarazioni soggetti attuatori

M6C2I1.1.1: Digitalizzazione DEA I e II livello Stato di avanzamento intervento

 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)	Ordini effettuati <i>Importo della somma degli ordini dei soggetti attuatori tra le diverse iniziative Consip</i>	Ordini effettuati <i>% rispetto al finanziamento</i>
	1.349.566.257,80 €	93 %



ITALIA: Ordini effettuati, valore % rispetto al finanziamento al 21 novembre 2025






M6C2I1.1.2: Grandi apparecchiature

Stato di avanzamento intervento

ITALIA: FOCUS -
Collaudi
al 21 novembre 2025

Dati consolidati il 21 novembre 2025
Ns Elaborazione su base dati da
dichiarazioni soggetti attuatori

	TARGET CIS (rimodulazioni al 21/11/2025)	TARGET CID	ORDINATE (Valore % sul totale app.re CID)	CONSEGNATE (Valore % sul totale app.re CID)	COLLAUDATE (Valore % sul totale app.re CID)
ACCELERATORI LINEARI	83	78	Oltre 100%	Oltre 100%	Oltre 100%
ANGIOGRAFI	197	193	Oltre 100%	86%	82%
ECOTOMOGRAFI	995	928	Oltre 100%	Oltre 100%	Oltre 100%
GAMMA CAMERE	79	78	Oltre 100%	99%	96%
GAMMA CAMERE/TAC	55	51	Oltre 100%	Oltre 100%	Oltre 100%
MAMMOGRAFI	297	295	Oltre 100%	99%	99%
PET/TAC	36	34	Oltre 100%	97%	85%
RMN	192	178	Oltre 100%	79%	76%
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	953	932	Oltre 100%	91%	89%
TAC	350	333	Oltre 100%	96%	95%
TOTALE G.A.	3237	3100	Oltre 100%	96%	95%

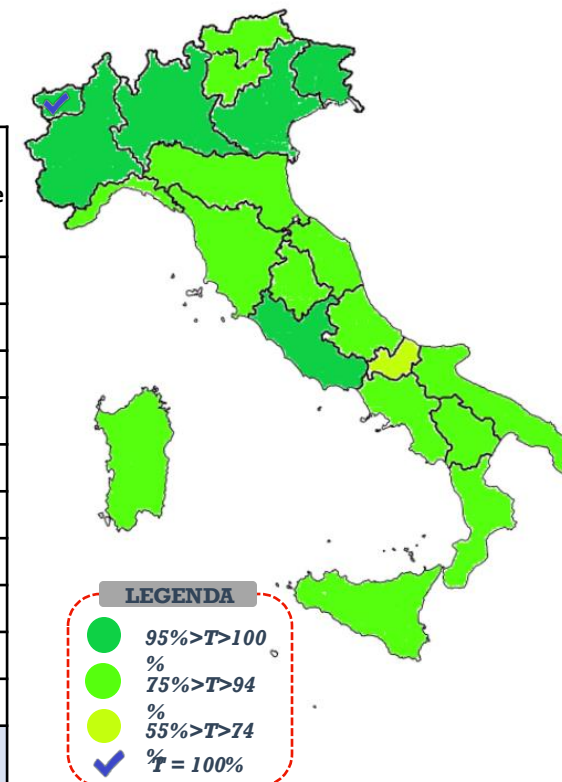




M6C2I1.1.2: Grandi apparecchiature

Stato di avanzamento intervento

ITALIA: FOCUS -
Collaudi
al 21 novembre 2025

Dati consolidati il 21 novembre 2025
Ns Elaborazione su base dati da
dichiarazioni soggetti attuatori

	TARGET CIS (rimodulazioni al 21/11/2025)	TARGET CID	ORDINATE (Valore % sul totale app.re CID)	CONSEGNATE (Valore % sul totale app.re CID)	COLLAUDATE (Valore % sul totale app.re CID)
Acceleratori Lineari; PET/TAC;RMN;	311	290	Oltre 100%	89%	84%
Angiografi; Gamma camere, Gamma camere/TAC; TAC	681	655	Oltre 100%	94%	92%
Sistemi radiologici fissi; Mammografi; Ecotomografi	2245	2155	Oltre 100%	98%	97%
TOTALE G.A.	3237	3100	Oltre 100%	96%	95%

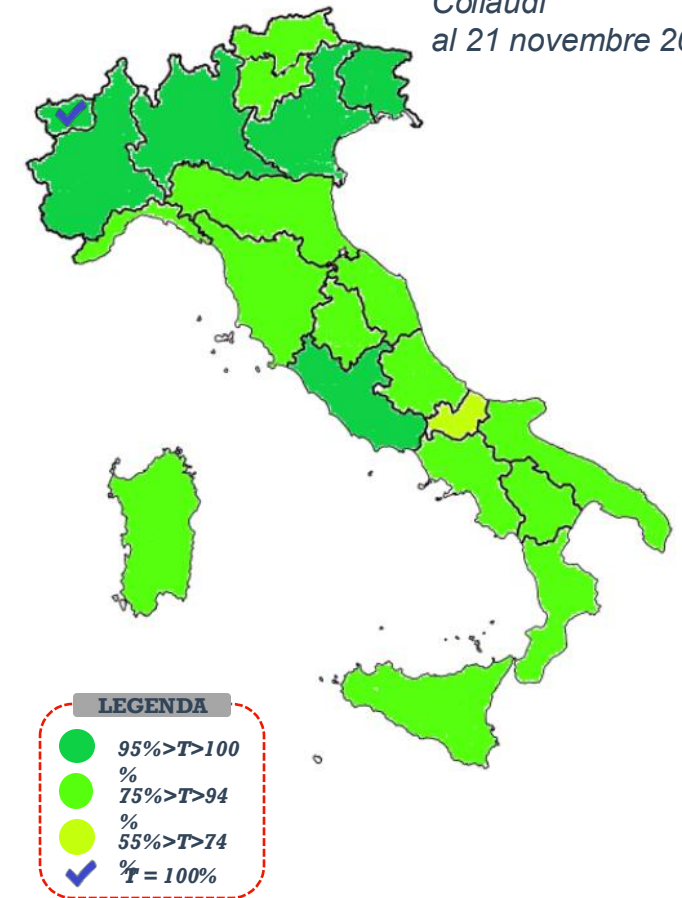

PNRR MISSIONE 6 SALUTE – STATO DI ATTUAZIONE DEL CIS IN VISTA DELLA RENDICONTAZIONE DELLA 9 E DELLA 10 RATA

Dott. Iachino Achille

Direttore Generale
Unità di Missione per l'attuazione del PNRR
Ministero della Salute

Dott. Altamura Gianluca

Direttore Ufficio di Monitoraggio
Unità di Missione per l'attuazione del PNRR
Ministero della Salute
