

# ***PNRR IN SANITA' STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI***

## *Lo stato dell'arte dei CIS*

Tavolo 4 – 23 novembre 2023


# *La Governance della Missione 6 e lo stato dell'arte della rimodulazione del PNRR con la Commissione Europea*

*Alessio Nardini*

Direttore Generale

Unità Missione Attuazione PNRR Salute Ministero della Salute



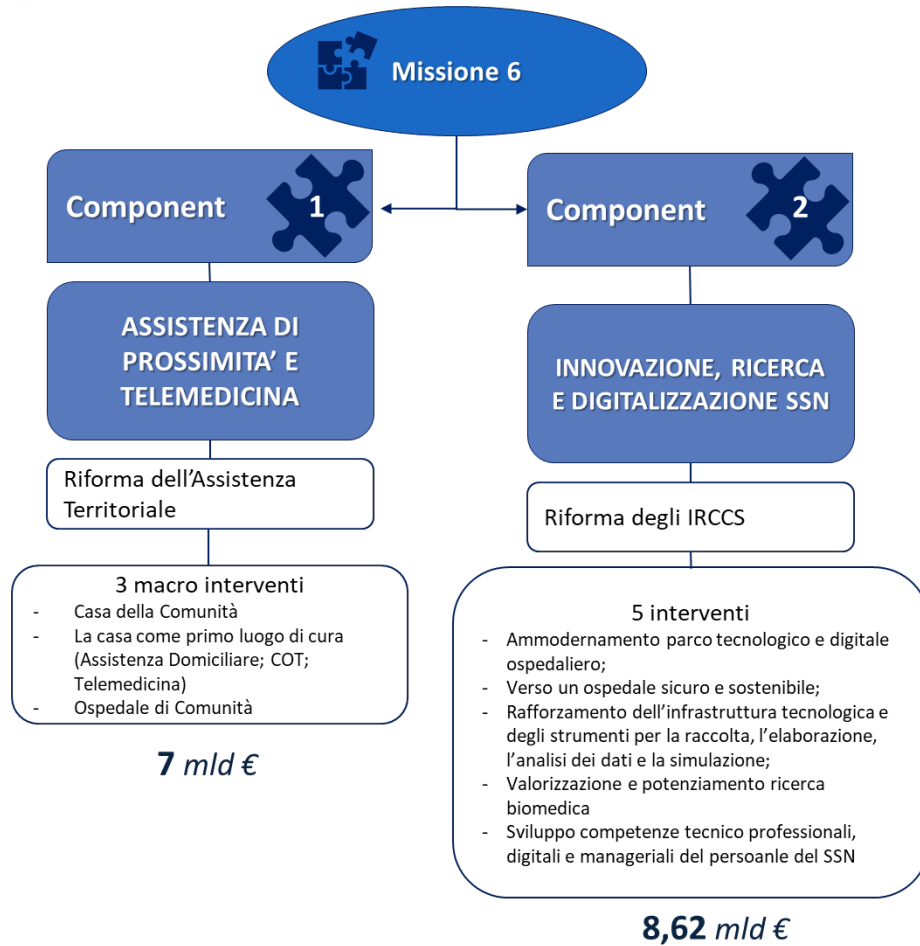


**OBIETTIVI**

- ✓ Allineare i servizi ai bisogni delle comunità;
- ✓ Integrare servizi sanitari e sociali;
- ✓ Superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio;
- ✓ Rafforzare i servizi sanitari di prossimità, secondo un approccio «one health»
- ✓ Innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN,
- ✓ Migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche;
- ✓ Sviluppare nuove competenze e superare il cd «imbuto formativo»
- ✓ Promuovere la ricerca e l'innovazione in ambito sanitario.



**RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE IN SALUTE**

**15,62 mld di euro**

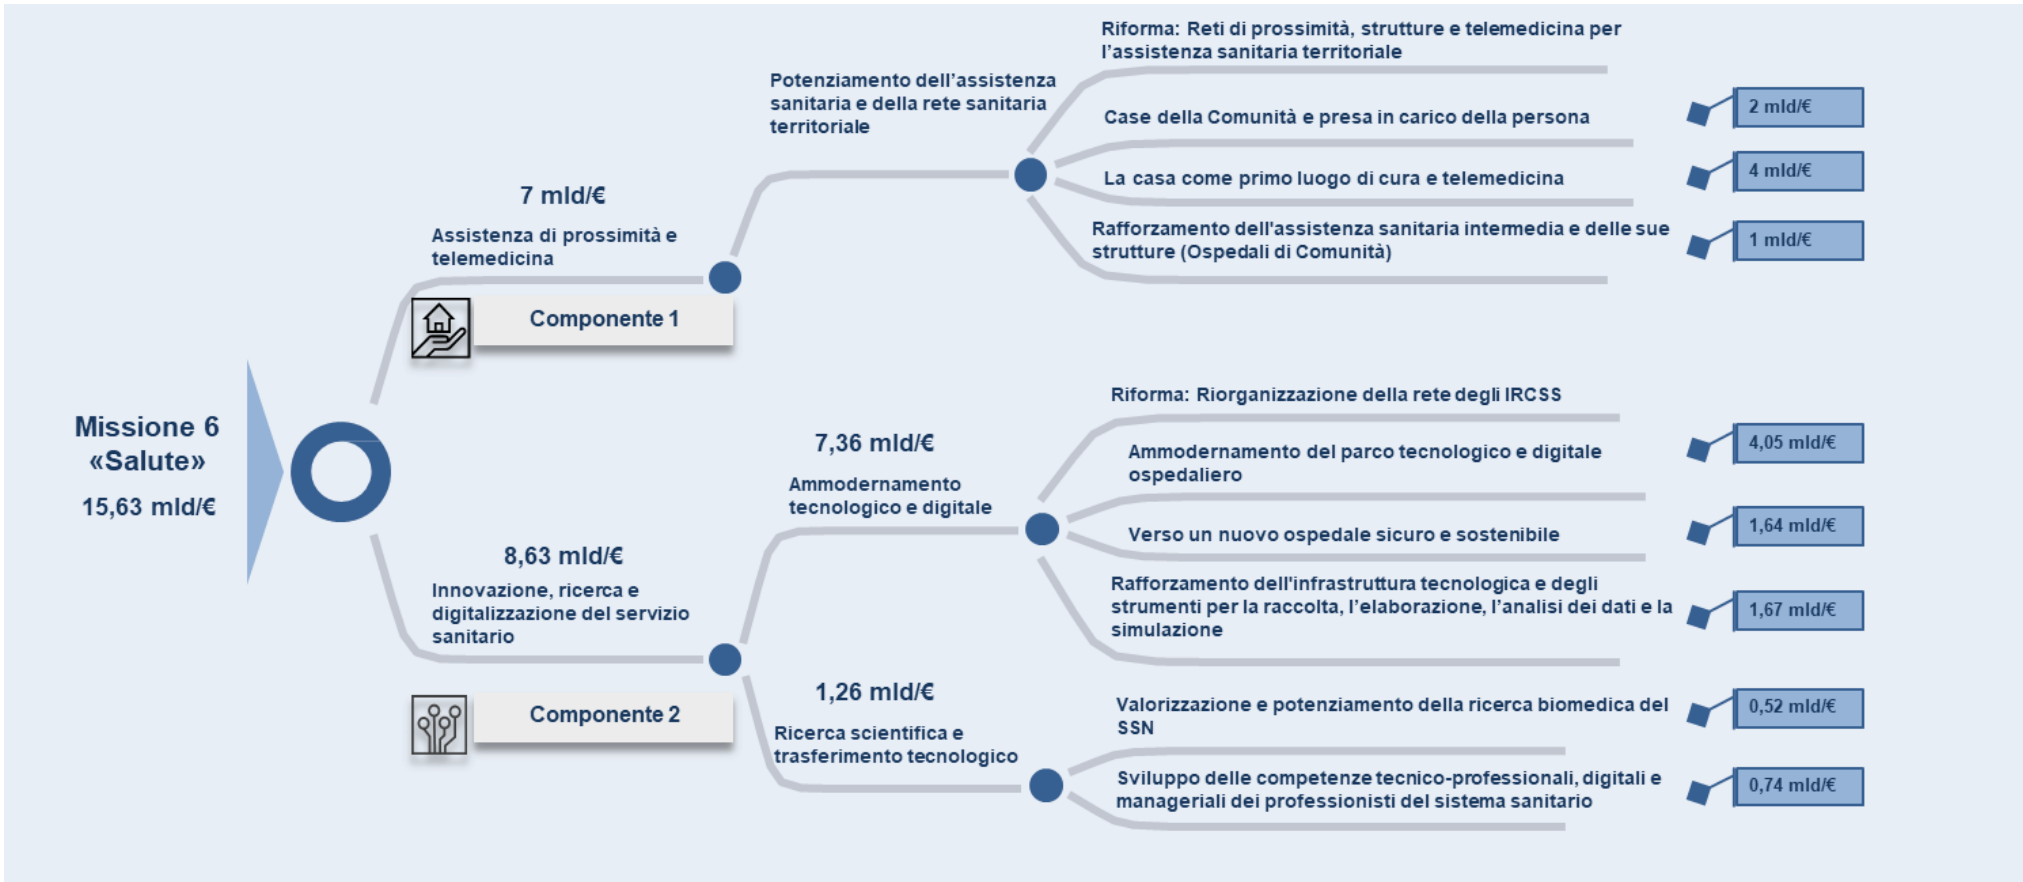

# La Governance della Missione 6: Salute

*Soggetti Attuatori e interventi*



DGSISS	DGRIC	AGENAS	MEF	Regioni / Province Autonome	
Rafforzamento infrastrutture e strumenti di Data Analysis del MdS	Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica dell'SSN	Intelligenza artificiale	Tessera Sanitaria (progetti in essere)	Case della Comunità	Ospedale sicuro e sostenibile
SDK	DGPROGS	Portale trasparenza	MUR	Assistenza domiciliare	Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni
Rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale	Modello di simulazione e previsione – Concettualizzazione e sviluppo algoritmo	Telemedicina	Contratti di formazione medico-specialistica	COT strutture	Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali
Modello di simulazione e previsione - Progettazione e costruzione dello strumento	DGPROF	DTD		COT - Interconnessione aziendale	Borse aggiuntive MMG
PNT	Formazione manageriale	Repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi, interfaccia user-friendly		COT - Device	Corso di formazione in infezioni ospedaliere
DGPREV				Ospedali di Comunità	
National Health Prevention Hub				Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	

# La proposta di rimodulazione della Missione 6

## Component 1



Le proposte di rimodulazione riguardano la modifica dei target minimi da raggiungere e/o dei meccanismi di verifica e/o delle scadenze previste. La rimodulazione in corso di discussione con la CE non comporta il definanziamento delle misure e la riprogrammazione dei CIS.






M6C1 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona.



M6C1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina - 1.2.2 COT.



M6C1 - Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).

Rimodulazione Target 	Differimento scadenza 	Modifiche descrizione e/o Possibili nuovi interventi 
Rimodulazione del target da <b>1.350 a 1.038 interventi</b> , dovuto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento medio del costo dei materiali di costruzione (stimato in un <b>+30%</b>);</li> <li>Ritardi dovuti alla necessità di reperire finanziamenti aggiuntivi.</li> </ul>	<b>Non previsto.</b>	<b>Non previsto.</b>
Rimodulazione del target da <b>600 a 480 interventi</b> , dovuto all'aumento medio del costo dei materiali di costruzione (stimato in un <b>+25%</b> ).	Differimento del conseguimento dei target <b>M6C1-7</b> (da T2 2024 a T4 2024)	<b>Non previsto.</b>
Rimodulazione del target da <b>400 a 307 interventi</b> , dovuto all'aumento medio del costo dei materiali di costruzione (stimato in un <b>+30%</b> ).	<b>Non previsto.</b>	<b>Non previsto.</b>


# La proposta di rimodulazione della Missione 6

## Component 2



Le proposte di rimodulazione riguardano la modifica dei target minimi da raggiungere e/o dei meccanismi di verifica e/o delle scadenze previste.

La rimodulazione in corso di discussione con la CE non comporta il definanziamento delle misure e la riprogrammazione dei CIS.



Rimodulazione Target	Differimento scadenza	Modifiche descrizione e/o Possibili nuovi interventi
Non previsto.	Non previsto.	Nuovi strumenti contrattuali con stipula successiva al 31/12/2022 (CONSIP-MEPA/SDAPA)
Non previsto.	Differimento del conseguimento del target M6C2-6 (da T4 2024 a T2 2026).	Upgrade apparecchiature e possibilità di riuso delle apparecchiature sostituite
Rimodulazione del target da 109 ad 84 interventi, dovuto all'aumento medio del costo dei materiali di costruzione (stimato in un +30%).	Non previsto.	Non previsto.
Non previsto.	Non previsto.	Integrazione/inserimento dei documenti nel FSE dai documenti nativi digitali, escludendo dal perimetro dell'intervento la migrazione/trasposizione ad hoc di documenti cartacei attuali o vecchi.

# *Monitoraggio dello stato di attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo*

*Gianluca Altamura*

Direttore Ufficio II di Monitoraggio

Unità Missione Attuazione PNRR Salute Ministero della Salute





# Stato di attuazione interventi strutturali al T3 2023

(dati III trim 2023 consolidati al 20 ottobre 2023)

## Component 1 – Assistenza territoriale



Descrizione Milestone/Target	Milestone/Target	CdC	COT	OdC
Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara	Target ITA	T1 2023 ✓	T4 2022 ✓	T1 2023 ✓
Assegnazione dei codici CIG	Target ITA	T2 2023* ✓	T1 2023* ✓	T2 2023* ✓
Stipula dei contratti	Target ITA	T4 2023* 65% ✓	T2 2023* 88% ✓	T4 2023* 63% ✓

## Component 2 - Antisismica




Descrizione Milestone/Target	Milestone/Target	Ospedale Sicuro PNRR
Pubblicazione della procedura di gara per interventi antisismici	Milestone ITA	T1 2023 ✓

\* Scadenza anticipata di un trimestre dai CIS

**I target riferiti alla stipula dei contratti per linea di investimento – Focus territoriale**  
 (dati III trim 2023 consolidati al 20 ottobre 2023)


**COT**

T2 2023

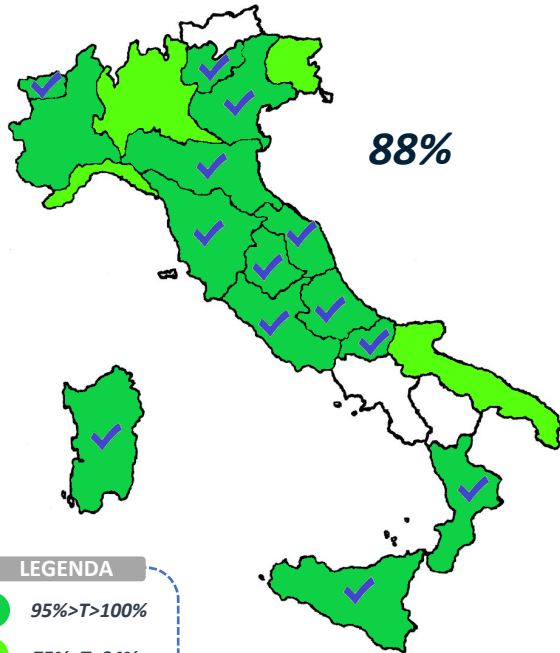


**Case della Comunità**

T4 2023\*

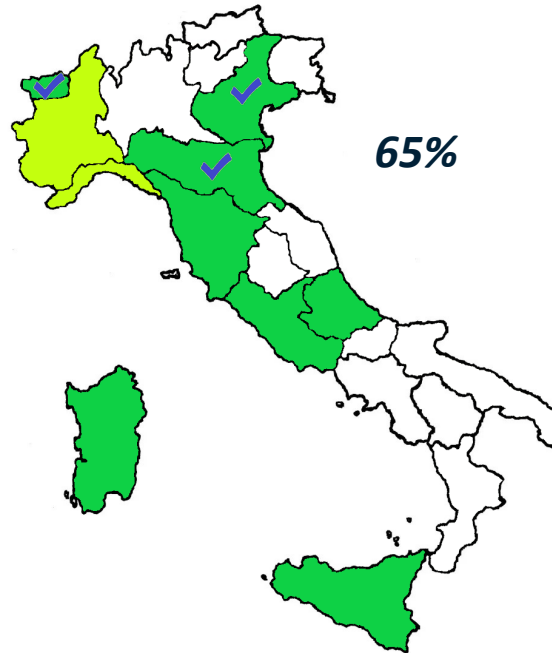

**Ospedali di Comunità**

T4 2023\*

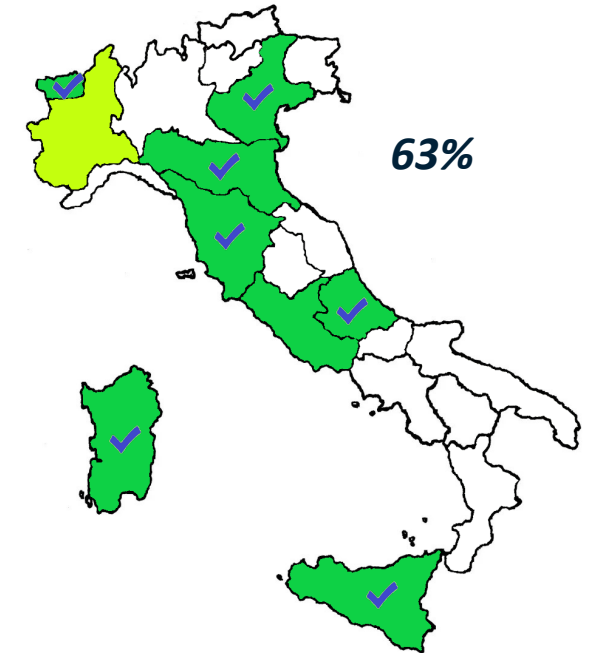

LEGENDA

- 95% > T > 100%
- 75% > T > 94%
- 55% > T > 74%
- ✓ T = 100%

\* La scadenza prevista dai CIS era anticipata al terzo trimestre 2023 (T3 2023)



# Stato di attuazione interventi di digitalizzazione al T3 2023

(dati III trim 2023 consolidati al 20 ottobre 2023)

## Component 1 – Interconnessione Aziendale

Descrizione Milestone/Target	Milestone/Target	Interconnessione Aziendale
Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'interconnessione aziendale	Target ITA	T4 2022 ✓
Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per l'interconnessione aziendale	Target ITA	T1 2023* ✓
Stipula contratti per l'interconnessione aziendale	Target ITA	T2 2023* 89% 🔄



## Component 2 – Ammodernamento Tecnologico – Digitalizzazione DEA I e II livello

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)	Target EU Digitalizzazione delle strutture DEA I e II livello	Effettuati ordinativi (AS e ODA Consip) per oltre il 35% delle risorse finanziate 510.738.214,47
	T4 2025	

## Component 2 – Ammodernamento Tecnologico – Dettaglio grandi apparecchiature

	PROGRAMMATE CIS	ORDINATE	CONSEGNATE	COLLAUDATE
ACCELERATORI LINEARI	82	79	23	17
ANGIOGRAFI	193	159	48	44
ECOTOMOGRAFI	928	911	841	820
GAMMA CAMERE	82	78	22	11
GAMMA CAMERE/TAC	54	47	13	8
MAMMOGRAFI	294	267	122	103
PET/TAC	34	32	13	11
RMN	190	152	18	11
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	937	759	151	134
TAC	342	300	56	51
<b>TOTALE</b>	<b>3136</b>	<b>2784</b>	<b>1307</b>	<b>1210</b>

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) – dettaglio apparecchiature	ORDINATE	CONSEGNATE	COLLAUDATE
	<b>90%</b>	<b>42%</b>	<b>39%</b>




# Stato di attuazione interventi di digitalizzazione al T3 2023


(dati III trim 2023 consolidati al 20 ottobre 2023) - *SEGUE*

## Component 2 – Infrastruttura tecnologica

Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni	Target ITA Digitalizzazione nativa dei documenti FSE	8 agosto 2022 decreto ripartizione delle risorse; 7 settembre 2023 sottoscritto il DIM "Fascicolo sanitario elettronico 2.0." (G.U. S.G. 249 – 24.10.2023)
	T4 2024 	
Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi nazionali	Adozione dei 2 nuovi flussi	7 agosto 2023 sottoscritti i DM istitutivi dei flussi SIAR e SICOF. Al 20.10.2023 adottati da tutte le regioni e provincie autonome con atto proprio.
	T3 2023* 	

## Component 2 – Formazione

Borse aggiuntive di formazione in medicina generale	Target EU 1800 borse aggiuntive	Target EU 2700 borse aggiuntive	con DM 14.07.2023 (G.U. S.G. 209 – 07.09.2023) assegnate le risorse per il terzo ciclo formativo 2023/2026 (33.991.002,00 euro).
	T2 2023 	T2 2024 	
Corso in infezioni ospedaliere	Ulteriore Step - Selezione dei provider	Selezionati i provider di tutte le regioni e PP.AA. sono in corso le azioni necessarie all'attuazione dell'investimento	
	T1 2023 		

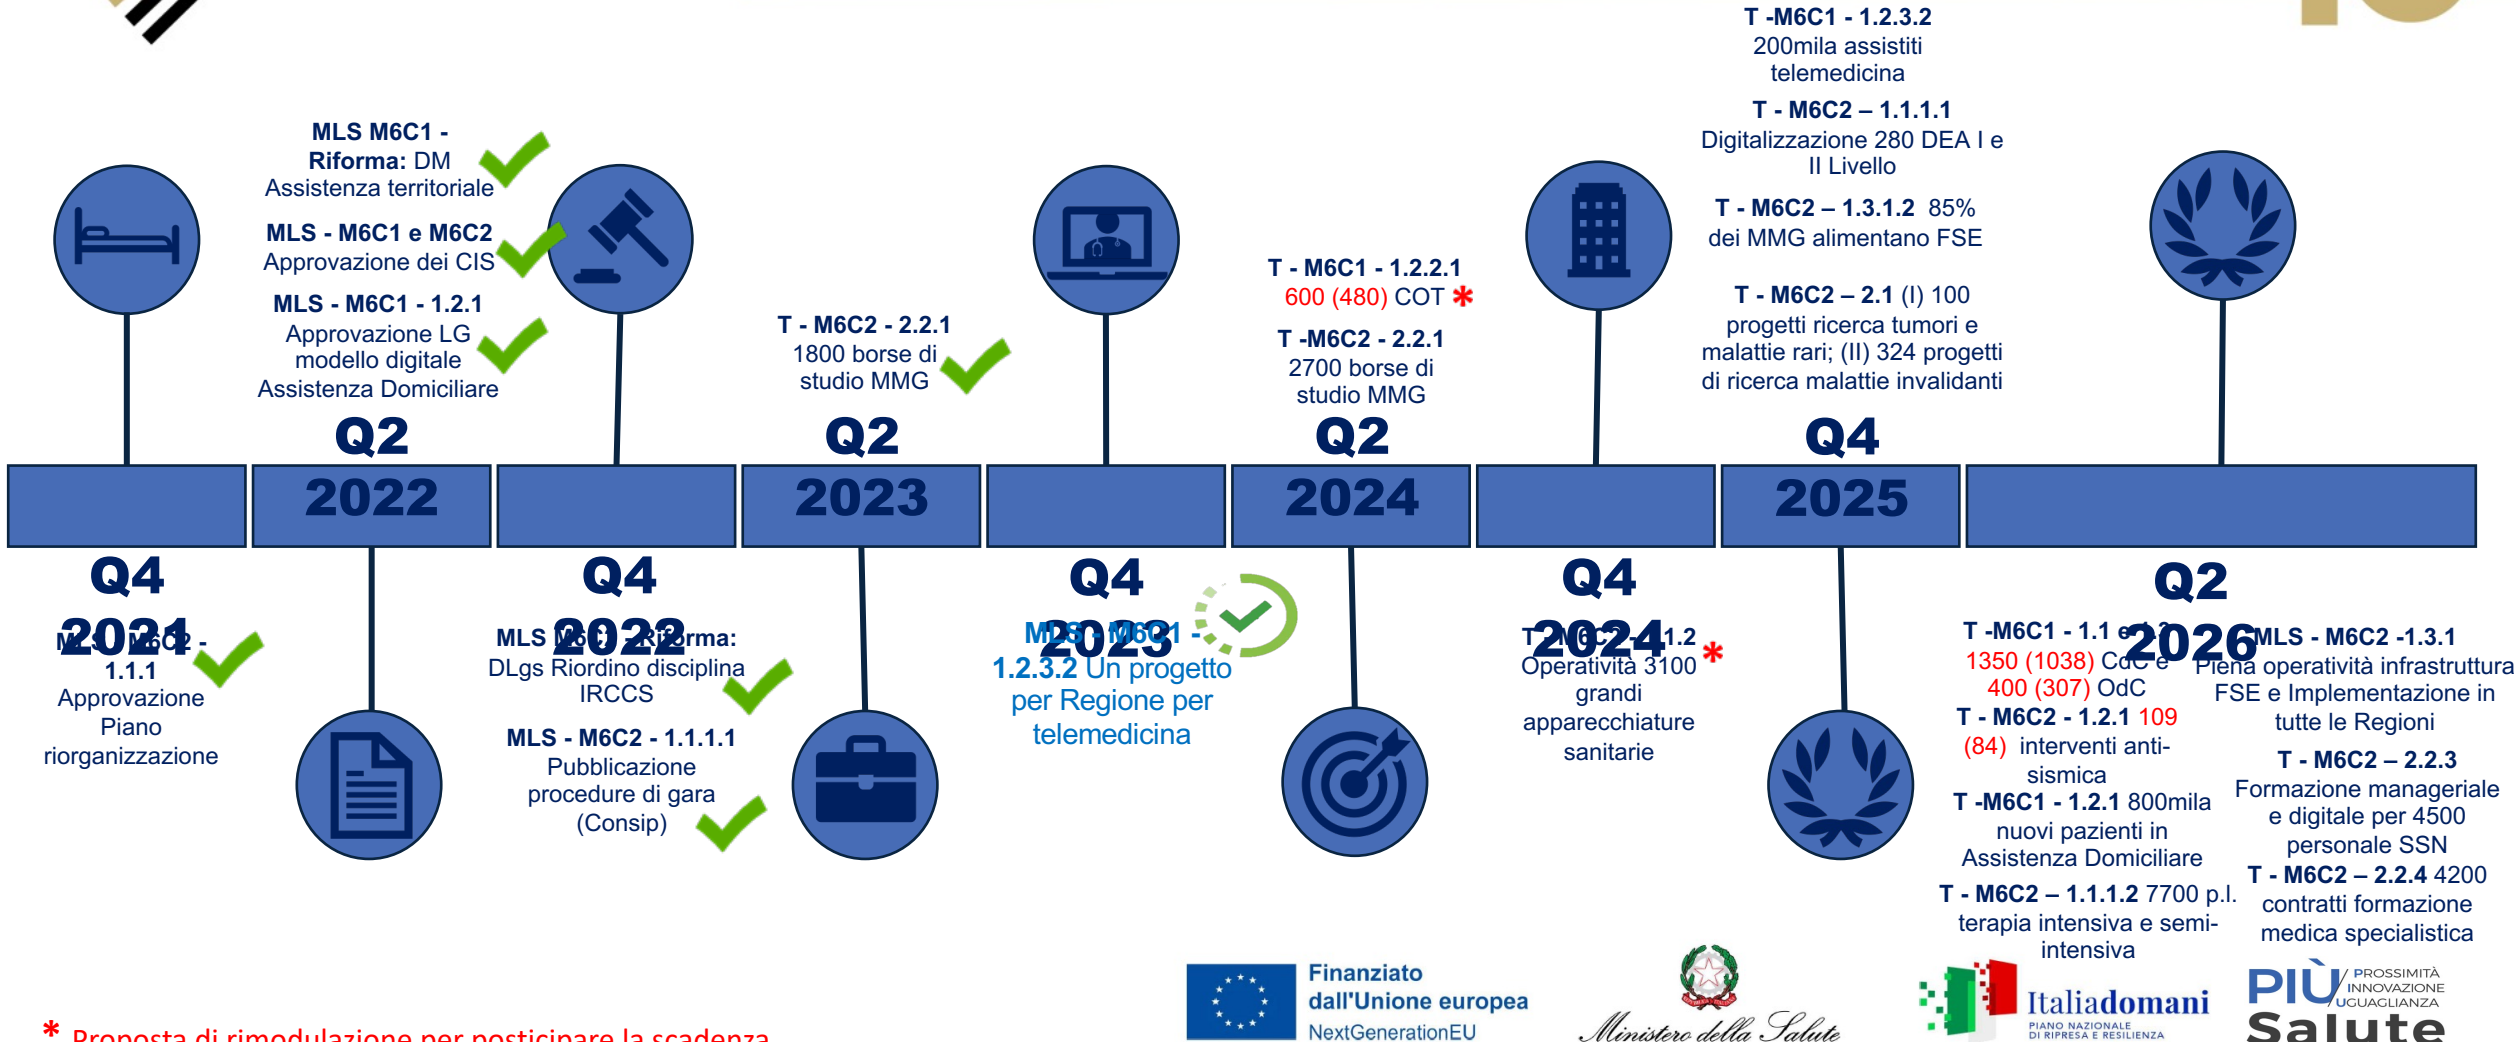

\* Proposta di rimodulazione per posticipare la scadenza



*Alessio Nardini*

Direttore Generale

Unità Missione Attuazione PNRR Salute Ministero della Salute

*Gianluca Altamura*

Direttore Ufficio II di Monitoraggio

Unità Missione Attuazione PNRR Salute Ministero della Salute
